ATB Mobilità S.p.A

Sede legale: Via Monte Gleno, 13
24125 Bergamo - Italy

Comune di Bergamo

VIDEOSORVEGLIANZA URBANA

AMPLIAMENTO DEL SISTEMA IN ESERCIZIO

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato I_06

- CRONOPROGRAMMA

Progettazione:
ing. Domenico Mascolo (n.2275 Albo Ing. Salerno)
ing. Luca Lombardi (n.30586 Albo Ing. Milano)

IL COMMITTENTE

30 Giugno 2023

ATB
PROGETTO ESECUTIVO ESTENSIONE FASE 3 SISTEMA SICUREZZA URBANA E PUBBLICA BERGAMO

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Progetto Estensione Fase 3 Sistema Videosorveglianza per la Sicurezza Urbana e Pubbica di Bergamo — Gantt Cronoprogramma

Comune di Corbetta

Data Inizio lavori: 11/9/2023

Direttore dei Lavori: Ing. Luca Lombardi

Settimane visualizzate: 1
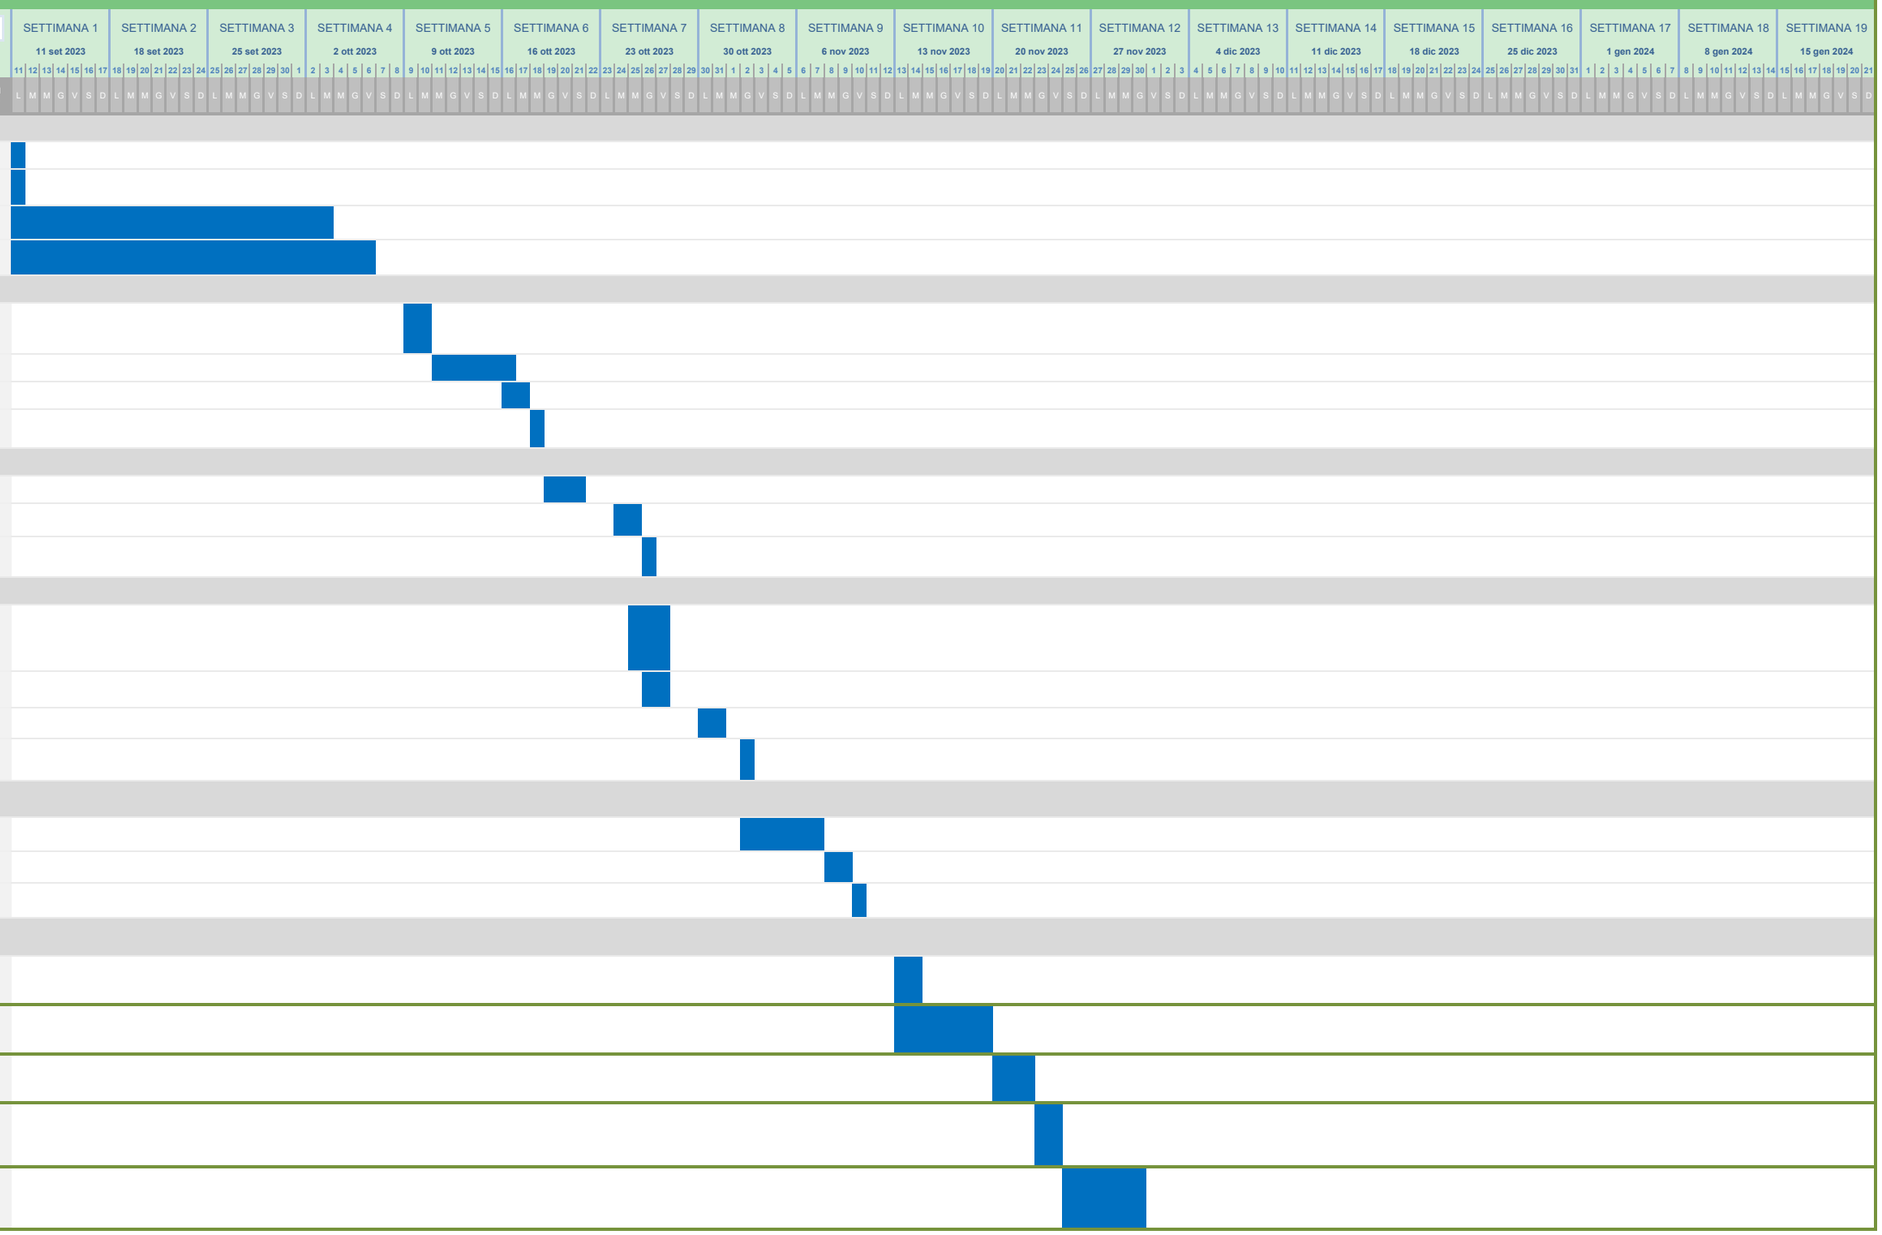
LIVELLO	ATTIVITÀ	RESPONSABILE	AFFIANCAMENTO	INIZIO	FINE	GIORNI	% ESEGUITO	GIORNI DI LAVORO
1	**Attivazione Cantiere**							
1.1	Kick-off meeting	Direttore Lavori	RUP	11/9/2023	11/9/2023	1	0%	1
1.2	Attivazione Cantiere	Direttore Lavori Direttore Cantiere		11/9/2023	11/9/2023	1	0%	1
1.3	Approvigionamento telecamere in cantiere	Tecnici	Ufficio acquisti	11/9/2023	3/10/2023	23	0%	17
1.4	Pratiche manomissione del suolo pubblico	Tecnici	Ufficio Amministrativo	11/9/2023	6/10/2023	26	0%	20
2	**Realizzazione Sistema Videosorveglianza Area Nord-Est**							
2.1	Realizzazione lavori civili (scavo, sottoservizi, plinto) per posizionamento nuovo palo	Tecnici	Direttore Cantiere Direttore Lavori	9/10/2023	10/10/2023	2	0%	2
2.2	Installazione telecamere	Tecnici	Direttore Cantiere Direttore lavori	11/10/2023	14/10/2023	4	0%	3
2.3	Configurazione e attivazione	Tecnici		16/10/2023	17/10/2023	2	0%	2
2.4	Verifica ripresa nuove telecamere con PL	Tecnici Direttore Lavori	Direttore Cantiere	18/10/2023	18/10/2023	1	0%	1
3	**Realizzazione Sistema Videosorveglianza Area Nord-Ovest**							
3.1	Installazione telecamere	Tecnici		19/10/2023	21/10/2023	3	0%	2
3.2	Configurazione e attivazione	Tecnici		24/10/2023	25/10/2023	2	0%	2
3.3	Verifica ripresa nuove telecamere con PL	Tecnici Direttore Lavori	Direttore Cantiere	26/10/2023	26/10/2023	1	0%	1
4	**Realizzazione Sistema Videosorveglianza Area Sud-Est**							
4.1	Realizzazione lavori di predisposizione e inserimento tubi, guaine e scatole su struttura in cemento armato e carpenteria in acciaio	Tecnici	Direttore Cantiere Direttore Lavori	25/10/2023	27/10/2023	3	0%	3
4.2	Installazione telecamere	Tecnici		26/10/2023	27/10/2023	2	0%	2
4.3	Configurazione e attivazione	Tecnici		30/10/2023	31/10/2023	2	0%	2
4.4	Verifica ripresa nuove telecamere con PL	Tecnici Direttore Lavori	Direttore Cantiere	2/11/2023	2/11/2023	1	0%	1
5	**Realizzazione Sistema Videosorveglianza Area Sud-Ovest**							
5.1	Installazione telecamere	Tecnici		2/11/2023	7/11/2023	6	0%	4
5.2	Configurazione e attivazione	Tecnici		8/11/2023	9/11/2023	2	0%	2
5.3	Verifica ripresa nuove telecamere con PL	Tecnici Direttore Lavori	Direttore Cantiere	10/11/2023	10/11/2023	1	0%	1
6	**Ultimazione Lavori - As Built - Verifica Regolare Esecuzione / Collaudo**							
6.1	Verifiche Sistema CCTV e Verbale Ultimazione Lavori	Direttore Lavori	Direttore Cantiere Tecnici	13/11/2023	14/11/2023	2	0%	2
6.2	Produzione As built, DICO, Documenti Tecnici e Manuali	Ufficio tecnico	Direttore Cantiere Tecnici	13/11/2023	19/11/2023	7	0%	5
6.3	Verifica documetale	Direttore Lavori		20/11/2023	22/11/2023	3	0%	3
6.4	Verifica funzionale, prestazionale per emissione certificato di regolare esecuzione	Direttore Lavori	Direttore Cantiere Tecnici	23/11/2023	24/11/2023	2	0%	2
6.5	Emissone Certificato Regolare Escuzione/Verbale di Collaudo	Direttore Lavori	RUP	25/11/2023	30/11/2023	6	0%	4
